

世行贷款辽宁技术职业教育和培训项目

业主名称: 辽宁城市建设职业技术学院

合同名称: 生态节能实验楼(土建工程)

监理公司: 辽宁省建筑设计研究院项目管理咨询公司

合同编号: LUCS/1.1

支付申请报表(最终)

承包人: 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司

(公章)

日期:



世行贷款辽宁技术职业教育和培训项目

监理公司: 辽宁省建筑设计研究院项目管理咨询公司

地 址:

签发日期:

2015.12.4

文档编号:

业 主: 辽宁城市建设职业技术学院

地 址:

合同名称: 生态节能实验楼(土建工程)

合同编号: LUCS/1.1

第 6 号支付证书(最终)

工程截止到: 2015.9.30

本期累计完成工程额 (其中含变更额) Y 1,403,879.61 (13.31%) Y 10,550,773.32

合同保留金限额: Y 567,597.09

扣保留金: Y -527,538.67

合同预付款: (合同价x) Y 0.00

扣回预付款: (预付款x) 0.00

本期确认总金额: Y 10,023,234.65

扣上期确认总金额: Y 8,996,613.44

本期应支付金额: Y 1,026,621.21

我根据合同确认本期金额:(大写) 壹佰零贰万陆仟陆佰贰拾壹元贰角壹分

应支付给下述的承包人。

项目监理:(签字)

(公章)

在此日期前支付: 2016.1.1

支付给:

承包人: 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司

地 址:

主 送: 业 主 5 份

抄 送: 承 包 人 2 份

监理公司:(存档) 2 份

业 主:

支付金额: 壹佰零贰万陆仟陆佰贰拾壹元贰角壹分

1026621.21元

支付日期:

2015.12.7

业 主 (签字、公章):

项目名称: 辽宁技术职业教育和培训项目

承包人: 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司

合同名称: 生态节能实验楼(土建工程)


合同编号: LUCS/1.1

支付申请一汇总表(最终)

工程截止到: 2015年9月30日

细目号	名称	分部小计	占合同价%	分部工程完成值	占分部%	分部开工日期
A	B	C	D	E	F=E/C	J
1	一般条款	26,650	0%	26,650.00	100%	2013年4月
2	土建工程	8,925,120	79%	7,841,348.44	88%	2013年5月
3	室内给排水、消防喷淋工程	301,797	3%	275,818.96	91%	
4	建筑采暖、通风设施	368,155	3%	349,326.10	95%	
5	建筑电气	685,700	6%	653,750.21	95%	
A	工程量单小计	10,307,422	91%	9,146,893.71	89%	
B	计日工	13,778	0%	0	0%	
C	不可预见费	1,030,742	9%	0	0%	
	变更令(合计)	1,030,742		1,103,879.61	12%	占合同价%
	合同价	11,351,942	完成额	10,550,773.32	93%	
开工日期:	2013年4月1日	计划完工日期:	2014年9月30日	年度-月份:		
计划工期:		完工日期(延期):	2015年9月30日	实际进度:		
实际工期:		实际完工日期:		计划进度:		

工程施工形象进度表

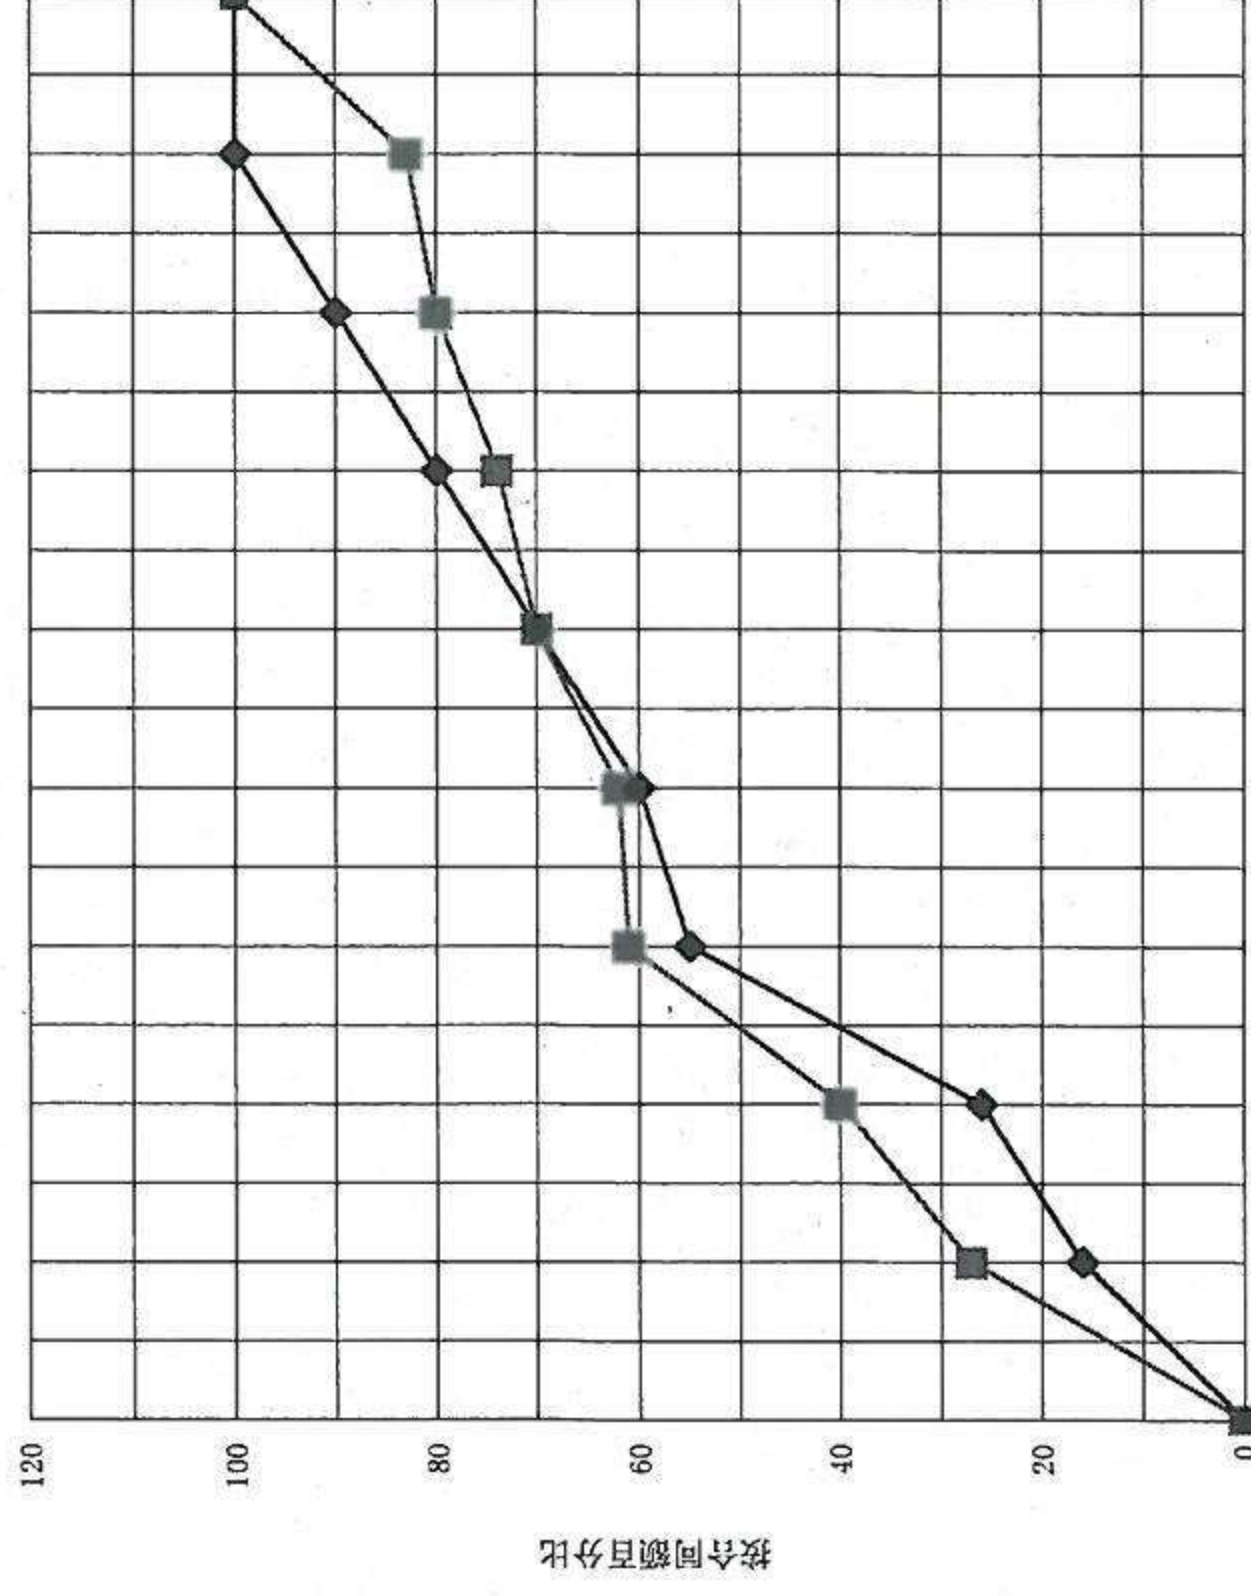

填表人: 王博

日期: 2015.12.3

承包人代表: 张立军

日期: 2015.12.3

检查人: 沈力新

日期: 2015.12.4

项目监理: (签字、公章)

日期: 2015.12.4

项目名称: 辽宁技术职业教育和培训项目
 承包人: 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司

合同名称: 生态节能实验楼(土建工程)
 合同编号: LUCS/1.1

工程量清单报表

工程截止到: 2015年9月30日

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合同价	目前累计完成			到上期累计完成			本期完成		
						数量	金额	完成%	数量	金额	数量	金额	完成%	
1	一般条款		D	E	F=DxE	G=J+L	H=ExG		J	K=ExJ	L	M=ExL		
1.1	工程保险费	项	1.000	7650.000	7,650	1.00	7,650.00	100%	1.00	7,650.00		0.00	0%	
1.2	施工设备保险费	项	1.000	2000.000	2,000	1.00	2,000.00	100%	1.00	2,000.00		0.00	0%	
1.3	第三方保险费	项	1.000	5000.000	5,000	1.00	5,000.00	100%	1.00	5,000.00		0.00	0%	
1.4	进度照片和录像	项	1.000	2000.000	2,000	1.00	2,000.00	100%	0.51	1,020.00	0.49	980.00	49%	
1.5	竣工资料	项	1.000	3000.000	3,000	1.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	1.00	3,000.00	100%	
1.6	对项目监理的服务	项	1.000	7000.000	7,000	1.00	7,000.00	100%	0.51	3,570.00	0.49	3,430.00	49%	
	细目1小计				26,650		26,650.00	100%		19,240.00		7,410.00	28%	
2	土建工程													
2.1	土方工程													
2.1.1	现场清理及平整	项	1.000	2000.000	2,000	1.00	2,000.00	100%	1.00	2,000.00		0.00	0%	
2.1.2	挖土方	m3	13704.000	8.200	112,373	17,523.49	143,692.62	128%	11703.32	95,967.22	5820.17	47,725.39	42%	
2.1.3	回填土	m3	2824.000	9.000	25,416	7,093.39	63,840.51	251%	1273.23	11,459.07	5820.16	52,381.44	206%	
2.1.4	余土外运	m3	10832.000	9.100	98,571	10,430.09	94,913.82	96%	10430.09	94,913.82		0.00	0%	
2.1.4	挖淤泥	m3	2476.000	12.000	29,712	0.00	0.00	0%		0.00		0.00	0%	
2.2	混凝土工程													
2.2.1	混凝土C10（垫层）	m3	219.000	290.000	63,510	260.07	75,420.30	119%	260.07	75,420.30		0.00	0%	
2.2.2	防水钢筋混凝土（筏板基础）	m3	1770.000	832.000	1,472,640	1,723.55	1,433,993.60	97%	1723.55	1,433,993.60		0.00	0%	
2.2.3	钢筋混凝土C30（梁）	m3	593.000	1750.000	1,037,750	572.54	1,001,945.00	97%	572.54	1,001,945.00		0.00	0%	
2.2.4	钢筋混凝土C30（板）	m3	1136.000	1190.000	1,351,840	557.39	663,294.10	49%	557.38	663,282.20	0.01	11.90	0%	
2.2.5	钢筋混凝土C30（柱）	m3	156.000	1950.000	304,200	156.68	305,526.00	100%	156.68	305,526.00		0.00	0%	
2.2.6	钢筋混凝土C30（墙）	m3	339.000	1504.000	509,856	319.64	480,738.56	94%	258.09	388,167.36	61.55	92,571.20	18%	
2.2.7	钢筋混凝土C30（雨棚）	m3	5.000	1277.000	6,385	5.00	6,385.00	100%	4.57	5,835.89	0.43	549.11	9%	
2.2.8	钢筋混凝土C30（女儿墙）	m3	50.000	1388.000	69,400	50.00	69,400.00	100%	49.85	69,191.80	0.15	208.20	0%	
2.2.9	钢筋混凝土C30（设备基础）	m3	6.000	770.000	4,620	0.41	315.70	7%	0.20	154.00	0.21	161.70	4%	
2.2.10	钢筋混凝土C30（楼梯）	m3	124.000	819.000	101,556	115.30	94,430.70	93%	87.42	71,596.98	27.88	22,833.72	22%	
2.2.11	防水钢筋混凝土（消防水池）	m3	8.000	1300.000	10,400	36.81	47,853.00	460%	36.81	47,853.00		0.00	0%	
2.2.12	防水钢筋混凝土（侧墙）	m3	73.000	2016.000	147,168	73.13	147,430.08	100%	73.13	147,430.08		0.00	0%	
2.2.13	防水加强层（-5.6至0.00之间）	m2	4933.000	19.500	96,194	4,897.71	95,505.35	99%	3178.78	61,986.21	1718.93	33,519.14	35%	
2.3	砌体工程													
2.3.1	煤矸石承重空心砖	m3	368.000	455.000	167,440	259.07	117,876.85	70%	240.11	109,250.05	18.96	8,626.80	5%	
2.3.2	蒸压加气混凝土砌块M10	m3	1183.000	375.000	443,625	1,043.36	391,260.00	88%	1043.36	391,260.00		0.00	0%	
2.4	钢结构工程													

项目名称: 辽宁技术职业教育实训基地项目
 承包人: 辽宁中宇建设(集团)有限公司

合同名称: 生态节能实验楼(土建工程)
 合同编号: LUCS/1.1

工程量清单报表

工程截止到: 2015年9月30日

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合同价	目前累计完成			到上期累计完成			本期完成		
						数量	金额	完成%	数量	金额	数量	金额	完成%	
2.4.1	楼梯扶手	m	79.000	150.000	11,850	77.12	11,568.00	98%	77.12	11,568.00		0.00	0%	
2.4.2	楼梯靠墙扶手	m	72.000	150.000	10,800	36.99	5,548.50	51%	36.99	5,548.50		0.00	0%	
2.4.3	室内防护栏杆	m	133.000	150.000	19,950	141.78	21,267.00	107%	141.78	21,267.00		0.00	0%	
2.4.4	中庭不锈钢扶手（钢化玻璃栏杆）	m	97.000	410.000	39,770	91.20	37,392.00	94%	91.20	37,392.00		0.00	0%	
2.4.5	正放四角锥螺栓球网架	kg	5368.000	8.000	42,944	7,422.23	59,377.84	138%	7,422.23	59,377.84		0.00	0%	
2.4.6	防腐+防火涂料	项	1.000	8052.000	8,052	1.00	8,052.00	100%	1.00	8,052.00		0.00	0%	
2.5	地面与楼面工程													
2.5.1	防水砂浆地面	m2	617.000	110.000	67,870	306.59	33,724.90	50%	276.67	30,433.70	29.92	3,291.20	5%	
2.5.2	彩色防滑地砖-400*400*5	m2	2956.000	42.000	124,152	539.12	22,643.04	18%	538.74	22,627.08	0.38	15.96	0%	
2.5.3	防静电活动地板楼面	m2	119.000	210.000	24,990	123.81	26,000.10	104%	123.81	26,000.10		0.00	0%	
2.5.4	彩色防滑地砖楼面	m2	3947.000	45.000	177,615	1,872.75	84,273.75	47%	1701.11	76,549.95	171.64	7,723.80	4%	
2.5.5	彩色花岗岩石材楼面-600*600*20	m2	1516.000	165.000	250,140	1,793.52	295,930.80	118%	1655.66	273,183.90	137.86	22,746.90	9%	
2.5.6	细石混凝土楼面	m2	67.000	16.000	1,072	67.86	1,085.76	101%	66.99	1,071.84	0.87	13.92	1%	
2.5.7	散水与台阶	项	1.000	4100.000	4,100	1.00	4,100.00	100%	1.00	4,100.00		0.00	0%	
2.5.8	采暖地沟	项	1.000	1820.000	1,820	1.00	1,820.00	100%	1.00	1,820.00		0.00	0%	
2.5.9	室内排水沟	m	37.000	110.000	4,070	33.85	3,723.50	91%	33.85	3,723.50		0.00	0%	
2.6	屋面工程													
2.6.1	彩色水泥砖屋面	m2	1300.000	191.000	248,300	1,219.31	232,888.21	94%	1219.31	232,888.21		0.00	0%	
2.6.2	绿页岩卷材防水屋面	m2	121.000	185.000	22,385	155.30	28,730.50	128%	155.30	28,730.50		0.00	0%	
2.6.3	种植屋面	m2	39.000	332.000	12,948	34.87	11,576.84	89%	34.87	11,576.84		0.00	0%	
2.6.4	地下室顶板屋面	m2	248.000	186.000	46,128	279.88	52,057.68	113%	279.88	52,057.68		0.00	0%	
2.7	门窗工程													
2.7.1	普通木门	m2	99.000	300.000	29,700	101.49	30,447.00	103%	101.49	30,447.00		0.00	0%	
2.7.2	普通断热型铝合金门	m2	73.000	530.000	38,690	72.11	38,218.30	99%	72.11	38,218.30		0.00	0%	
2.7.3	组合断热型铝合金门	m2	128.000	510.000	65,280	127.41	64,979.10	100%	127.41	64,979.10		0.00	0%	
2.7.4	钢制防火门	m2	164.000	520.000	85,280	157.29	81,790.80	96%	157.29	81,790.80		0.00	0%	
2.7.5	百叶窗（屋面通风道防雨通道）	m2	1.000	230.000	230	0.96	220.80	96%	0.96	220.80		0.00	0%	
2.7.6	普通断热型铝合金窗	m2	508.000	510.000	259,080	506.98	258,559.80	100%	506.98	258,559.80		0.00	0%	
2.7.7	乙级防火固定窗	m2	23.000	420.000	9,660	22.52	9,458.40	98%	22.52	9,458.40		0.00	0%	
2.8	装饰及装修工程													
2.8.1	花岗岩板墙面-300*400*25	m2	878.000	175.000	153,650	435.88	76,279.00	50%	435.88	76,279.00		0.00	0%	
2.8.2	乳胶漆墙面	m2	10775.000	23.000	247,825	7,338.47	168,784.81	68%	6389.18	146,951.14	949.29	21,833.67	9%	
2.8.3	瓷砖墙面-400*300*5	m2	447.000	82.000	36,654	441.26	36,183.32	99%	441.26	36,183.32		0.00	0%	

项目名称: 辽宁技术职业教育和培训项目
生态节能实验楼(土建工程)
合同名称:
LUCS/1.1
合同编号:

工程名称: 生态节能实验楼(土建工程)
合同名称:
LUCS/1.1
合同编号:

工程量清单报表

工程截止到: 2015年9月30日

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合同价	目前累计完成			到上期累计完成			本期完成		
						数量	金额	完成%	数量	金额	完成%	数量	金额	完成%
2.8.4	防火保温砂浆墙面	m2	229.000	46.500	10,649	1,057.19	49,159.34	462%	1057.19	49,159.34			0.00	0%
2.8.5	花岗岩石材外墙面	m2	1930.000	165.000	318,450	2,787.93	460,008.45	144%	2119.74	349,757.10		668.19	110,251.35	35%
2.8.6	防水涂料外墙面	m2	90.000	185.000	16,650	99.50	18,407.50	111%	99.50	18,407.50			0.00	0%
2.8.7	花岗石踢脚	m2	266.000	54.000	14,364	83.79	4,524.66	32%	83.79	4,524.66			0.00	0%
2.8.8	墙砖踢脚	m2	982.000	15.000	14,730	172.77	2,591.55	18%	172.77	2,591.55			0.00	0%
2.8.9	水泥砂浆踢脚	m2	23.000	10.000	230	15.88	158.80	69%	15.88	158.80			0.00	0%
2.8.10	面砖外墙裙	m2	40.000	142.000	5,680	32.11	4,559.62	80%	32.11	4,559.62			0.00	0%
2.8.11	轻钢龙骨防火纸面石膏板吊顶	m2	4810.000	68.000	327,080	3,588.60	244,024.80	75%	3004.35	204,295.48		583.25	39,729.32	12%
2.8.12	乳胶漆顶棚	m2	650.000	31.000	20,150	640.31	19,849.61	99%	640.31	19,849.61			0.00	0%
2.8.13	铝扣板吊顶	m2	162.000	120.000	19,440	169.19	20,302.80	104%	169.19	20,302.80			0.00	0%
2.8.14	PVC板吊顶	m2	200.000	54.000	10,800	204.28	11,031.12	102%	204.28	11,031.12			0.00	0%
2.8.15	成品浴厕隔断	m2	96.000	137.000	13,152	131.53	18,019.61	137%	131.53	18,019.61			0.00	0%
2.8.16	大理石窗台板(厚25mm)	m2	45.000	114.000	5,130	44.87	5,115.18	100%	44.87	5,115.18			0.00	0%
2.8.17	洗漱台	m2	9.000	319.000	2,871	8.28	2,641.32	92%	8.28	2,641.32			0.00	0%
2.8.18	GRC空心轻质隔墙板(厚120)	m2	167.000	150.000	25,050	155.12	23,268.00	93%	155.12	23,268.00			0.00	0%
2.8.19	洗手盆安全抓杆	套	6.000	189.000	1,134		0.00	0%	6.00	1,134.00		-6.00	-1,134.00	-100%
2.8.20	坐便器安全抓杆	套	6.000	189.000	1,134	2.00	378.00	33%	6.00	1,134.00		-4.00	-756.00	-67%
2.8.21	坡道连体扶手	m	14.000	189.000	2,646	15.35	2,901.15	110%	15.35	2,901.15			0.00	0%
2.8.22	轻钢玻璃雨篷	m2	26.000	620.000	16,120	19.20	11,904.00	74%	19.20	11,904.00			0.00	0%
	细目2小计(按清单量汇总金额)			8,925,120			7,841,348	88%		7,379,043.72			462,304.72	5%
3	室内给排水、消防喷淋工程													
3.1	给水工程(1.0MPa)													
3.1.1	室内承插铸铁给水管DN100	m	3.000	159.280	478	3.00	477.84	100%	3.00	477.84			0.00	0%
3.1.2	衬塑复合钢管(冷水型)DN100	m	14.000	164.620	2,305	13.70	2,255.29	98%	13.70	2,255.29			0.00	0%
3.1.3	衬塑复合钢管(冷水型)DN70	m	17.000	96.830	1,646	10.20	987.67	60%	10.20	987.67			0.00	0%
3.1.4	衬塑复合钢管DN50	m	48.000	47.570	2,283	41.70	1,983.67	87%	41.70	1,983.67			0.00	0%
3.1.5	衬塑复合钢管(冷水型)螺纹连接DN40	m	5.000	29.150	146	4.80	139.92	96%	4.80	139.92			0.00	0%
3.1.6	衬塑复合钢管(冷水型)螺纹连接DN32	m	10.000	23.580	236	9.60	226.37	96%	9.60	226.37			0.00	0%
3.1.7	衬塑复合钢管(冷水型)螺纹连接DN25	m	36.000	20.930	753	35.80	749.29	99%	35.80	749.29			0.00	0%
3.1.8	A型对夹式蝶阀DN100	个	1.000	449.550	450	1.00	449.55	100%	1.00	449.55			0.00	0%
3.1.9	A型对夹式蝶阀DN70	个	1.000	190.080	190	1.00	190.08	100%	1.00	190.08			0.00	0%
3.1.10	A型对夹式蝶阀DN50	个	6.000	120.630	724	6.00	723.78	100%	6.00	723.78			0.00	0%
3.1.11	螺纹阀门DN20	个	12.000	20.820	250	12.00	249.84	100%	12.00	249.84			0.00	0%

项目名称: 辽宁技术职业教育和培训项目
承包人: 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司

合同名称: 生态节能实验楼(土建工程)
合同编号: LUCS/1.1

工程量清单报表

工程截止到: 2015年9月30日

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合同价	目前累计完成			到上期累计完成			本期完成		
						数量	金额	完成%	数量	金额	数量	金额	完成%	
3.1.12	螺纹阀门 DN32	个	3.000	40.310	121	3.00	120.93	100%	3.00	120.93		0.00	0%	
3.1.13	螺纹阀门 DN40	个	6.000	52.010	312	6.00	312.06	100%	6.00	312.06		0.00	0%	
3.1.14	螺纹浮球阀 DN50	个	3.000	177.950	534	3.00	533.85	100%	3.00	533.85		0.00	0%	
3.1.15	柱式手盆	组	10.000	150.000	1,500	10.00	1,500.00	100%	10.00	1,500.00		0.00	0%	
3.1.16	台式手盆	组	18.000	225.000	4,050	18.00	4,050.00	100%	18.00	4,050.00		0.00	0%	
3.1.17	蹲便	组	28.000	150.000	4,200	28.00	4,200.00	100%	28.00	4,200.00		0.00	0%	
3.1.18	坐便（无障碍坐便器）	组	2.000	240.000	480	2.00	480.00	100%	2.00	480.00		0.00	0%	
3.1.19	拖布池	组	7.000	140.000	980	7.00	980.00	100%	7.00	980.00		0.00	0%	
3.1.20	小便器	组	14.000	100.000	1,400	14.00	1,400.00	100%	14.00	1,400.00		0.00	0%	
3.2	排水工程													
3.2.1	柔性抗震铸铁排水管（柔性接口）DN100	m	2.000	277.250	555	2.00	554.50	100%	2.00	554.50		0.00	0%	
3.2.2	柔性抗震铸铁排水管（柔性接口）DN75	m	9.000	196.070	1,765	8.80	1,725.42	98%	8.80	1,725.42		0.00	0%	
3.2.3	室内承插塑料排水管（零件粘结）DN200	m	24.000	62.390	1,497	24.00	1,497.36	100%	24.00	1,497.36		0.00	0%	
3.2.4	室内承插塑料排水管（零件粘结）DN150	m	45.000	51.270	2,307	43.95	2,253.32	98%	43.95	2,253.32		0.00	0%	
3.2.5	室内承插塑料排水管（零件粘结）DN100	m	220.000	35.850	7,887	218.60	7,836.81	99%	218.60	7,836.81		0.00	0%	
3.2.6	室内承插塑料排水管（零件粘结）DN100（管井内）	m	88.000	37.850	3,331	87.85	3,325.12	100%	87.85	3,325.12		0.00	0%	
3.2.7	室内承插塑料排水管（零件粘结）DN80	m	141.000	29.560	4,168	141.00	4,167.96	100%	141.00	4,167.96		0.00	0%	
3.2.8	室内承插塑料排水管（零件粘结）DN50	m	79.000	20.690	1,635	32.50	672.43	41%	32.50	672.43		0.00	0%	
3.2.9	室内承插塑料排水管（零件粘结）DN50 PPR塑料管	m	14.000	20.690	290	13.50	279.32	96%	13.50	279.32		0.00	0%	
3.2.10	地面扫除口 DN75	个	1.000	4.500	5	1.00	4.50	100%	1.00	4.50		0.00	0%	
3.2.11	地面扫除口 DN100	个	6.000	5.500	33	6.00	33.00	100%	6.00	33.00		0.00	0%	
3.2.12	地面扫除口 DN150	个	2.000	7.000	14	2.00	14.00	100%	2.00	14.00		0.00	0%	
3.2.13	地面扫除口 DN200	个	1.000	17.000	17	1.00	17.00	100%	1.00	17.00		0.00	0%	
3.2.14	地漏 DN50	个	20.000	5.500	110	20.00	110.00	100%	20.00	110.00		0.00	0%	
3.2.15	溢流口 DN100	个	1.000	180.000	180	1.00	180.00	100%	1.00	180.00		0.00	0%	
	压力排水									0.00				
3.2.16	室内承插塑料排水管（零件粘结）DN50	m	127.000	20.690	2,628	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	0%	
3.2.17	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 潜水排污泵 10m³/H=100m N=1.1kw	台	8.000	1720.000	13,760	8.00	13,760.00	100%	8.00	13,760.00		0.00	0%	
3.2.18	A型对夹式蝶阀DN50硬密封蝶阀YQD71X-10Q	个	8.000	120.630	965	8.00	965.04	100%	8.00	965.04		0.00	0%	
3.2.19	焊接法兰阀门 DN50	个	8.000	305.000	2,440	8.00	2,440.00	100%	8.00	2,440.00		0.00	0%	
3.2.20	避震喉 DN50 KXT型可曲挠橡胶接头	个	8.000	70.000	560	8.00	560.00	100%	8.00	560.00		0.00	0%	
3.2.21	压力表	块	8.000	30.000	240	8.00	240.00	100%	8.00	240.00		0.00	0%	

项目名称: 辽宁技术职业教育 and 培训项目
 承包人: 辽宁中宇建设 (集团) 有限责任公司

合同名称: 生态节能实验楼 (土建工程)
 合同编号: LUCS/1.1

工程清单报表

工程截止: 2015年9月30日

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合同价	目前累计完成			到上期累计完成			本期完成		
						数量	金额	完成%	数量	金额	数量	金额	完成%	
3.2.22	刚性防水套管 公称直径 50mm以内	个	1.000	60.000	60	1.00	60.00	100%	1.00	60.00		0.00	0%	
3.3	消防水工程 (1.6MPa)													
3.3.1	球墨给水铸铁管 承插连接 DN 100	m	3.000	219.280	658	3.00	657.84	100%	3.00	657.84		0.00	0%	
3.3.2	内外热浸镀锌钢管 沟槽连接 DN100	m	233.000	83.520	19,460	232.90	19,451.81	100%	232.90	19,451.81		0.00	0%	
3.3.3	内外热浸镀锌钢管 螺纹连接 DN70	m	43.000	48.830	2,100	42.75	2,087.48	99%	42.75	2,087.48		0.00	0%	
3.3.4	内外热浸镀锌钢管 螺纹连接 DN20	m	1.000	71.540	72	1.00	71.54	100%	1.00	71.54		0.00	0%	
3.3.6	沟槽式连接卡插 DN100	个	115.000	44.800	5,152	115.00	5,152.00	100%	115.00	5,152.00		0.00	0%	
3.3.7	法兰阀门 DN65mm	个	6.000	518.290	3,110	6.00	3,109.74	100%	6.00	3,109.74		0.00	0%	
3.3.8	法兰阀门 DN100mm	个	13.000	683.820	8,890	13.00	8,889.66	100%	13.00	8,889.66		0.00	0%	
3.3.9	螺纹法兰阀门 DN20mm	个	2.000	47.840	96	2.00	95.68	100%	2.00	95.68		0.00	0%	
3.3.10	室内消火栓 DN65mm单栓	套	21.000	134.320	2,821	21.00	2,820.72	100%	21.00	2,820.72		0.00	0%	
3.3.11	灭火器	具	42.000	77.000	3,234	42.00	3,234.00	100%	42.00	3,234.00		0.00	0%	
3.4	喷淋水工程													
3.4.1	球墨给水铸铁管 承插连接 DN 125	m	10.000	249.890	2,499	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	0%	
3.4.2	内外热浸镀锌钢管 沟槽连接 DN150	m	72.000	116.670	8,400	45.80	5,343.49	64%	45.80	5,343.49		0.00	0%	
3.4.3	内外热浸镀锌钢管 沟槽连接 DN25	m	72.000	105.000	7,560	72.00	7,560.00	100%	72.00	7,560.00		0.00	0%	
3.4.4	内外热浸镀锌钢管 沟槽连接 DN100	m	108.000	83.520	9,020	107.80	9,003.46	100%	107.80	9,003.46		0.00	0%	
3.4.5	内外热浸镀锌钢管 螺纹连接 DN80	m	166.000	58.360	9,688	143.30	8,362.99	86%	143.30	8,362.99		0.00	0%	
3.4.6	内外热浸镀锌钢管 螺纹连接 DN70	m	114.000	48.830	5,567	69.20	3,379.04	61%	69.20	3,379.04		0.00	0%	
3.4.7	内外热浸镀锌钢管 螺纹连接 DN65	m	29.000	48.830	1,416	29.00	1,416.07	100%	29.00	1,416.07		0.00	0%	
3.4.8	内外热浸镀锌钢管 螺纹连接 DN50	m	106.000	52.657	5,582	84.00	4,423.19	79%	84.00	4,423.19		0.00	0%	
3.4.9	内外热浸镀锌钢管 螺纹连接 DN40	m	59.000	44.924	2,651	58.40	2,623.56	99%	58.40	2,623.56		0.00	0%	
3.4.10	内外热浸镀锌钢管 螺纹连接 DN32	m	308.000	43.100	13,275	237.50	10,236.25	77%	237.50	10,236.25		0.00	0%	
3.4.11	内外热浸镀锌钢管 螺纹连接 DN25	m	798.000	44.631	35,616	621.60	27,742.63	78%	621.60	27,742.63		0.00	0%	
3.4.12	沟槽式连接卡插 DN150	个	25.000	69.340	1,734	25.00	1,733.50	100%	25.00	1,733.50		0.00	0%	
3.4.13	沟槽式连接卡插 DN125	个	50.000	56.520	2,826	50.00	2,826.00	100%	50.00	2,826.00		0.00	0%	
3.4.14	沟槽式连接卡插 DN100	个	51.000	44.800	2,285	51.00	2,284.80	100%	51.00	2,284.80		0.00	0%	
3.4.15	消防水泵接合器 地下式 100	套	2.000	1013.050	2,026	2.00	2,026.10	100%	2.00	2,026.10		0.00	0%	
3.4.16	湿式报警装置DN150mm	组	1.000	2996.060	2,996	1.00	2,996.06	100%	1.00	2,996.06		0.00	0%	
3.4.17	法兰阀门 DN150mm	个	2.000	1006.230	2,012	2.00	2,012.46	100%	2.00	2,012.46		0.00	0%	
3.4.18	法兰阀门 DN125mm	个	3.000	851.140	2,553	3.00	2,553.42	100%	3.00	2,553.42		0.00	0%	
3.4.19	法兰阀门 DN100mm	个	2.000	683.820	1,368	2.00	1,367.64	100%	2.00	1,367.64		0.00	0%	
3.4.20	水流指示器 (法兰连接) DN150mm	个	3.000	1358.910	4,077	3.00	4,076.73	100%	3.00	4,076.73		0.00	0%	

项目名称: 辽宁技术职业教育和培训项目
 承包人: 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司

合同名称: 生态节能实验楼(土建工程)
 合同编号: LUCS/1.1

工程量清单报表

工程截止到: 2015年9月30日

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合同价	目前累计完成			到上期累计完成			本期完成		
						数量	金额	完成%	数量	金额	数量	金额	完成%	
3.4.21	水流指示器（法兰连接） DN100mm	个	2.000	1031.130	2,062	2,062.26	100%	2.00	2,062.26		0.00	0%		
3.4.22	水喷头DN15mm 无吊顶	个	102.000	30.150	3,075	3,075.30	100%	102.00	3,075.30		0.00	0%		
3.4.23	水喷头DN15mm 有吊顶	个	261.000	34.810	9,085	9,085.41	100%	261.00	9,085.41		0.00	0%		
3.4.24	自动排气阀DN25	个	1.000	49.260	49	49.26	100%	1.00	49.26		0.00	0%		
3.4.25	螺纹法兰阀门 DN25mm	个	2.000	53.430	107	106.86	100%	2.00	106.86		0.00	0%		
3.4.26	法兰阀门 DN65mm	个	1.000	518.290	518	518.29	100%	1.00	518.29		0.00	0%		
3.4.27	法兰阀门 DN100mm	台	1.000	683.820	684	683.82	100%	1.00	683.82		0.00	0%		
3.4.28	管道上电磁阀	组	1.000	150.000	150	150.00	100%	1.00	150.00		0.00	0%		
3.4.29	末端试水装置DN25mm	个	9.000	302.640	2,724	2,723.76	100%	9.00	2,723.76		0.00	0%		
3.4.30	沟槽式连接卡插 DN150	个	17.000	69.340	1,179	1,178.78	100%	17.00	1,178.78		0.00	0%		
3.4.31	沟槽式连接卡插 DN100	个	6.000	44.800	269	268.80	100%	6.00	268.80		0.00	0%		
3.4.32	矩形钢板水箱 容量33.8m3	个	1.000	22600.000	22,600	22,600.00	100%	1.00	22,600.00		0.00	0%		
3.4.33	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 自动喷洒水泵 XBD5.4/30-100 G=30.0L/s H=50m N=30KW	台	2.000	800.000	1,600	1,600.00	100%	2.00	1,600.00		0.00	0%		
3.4.34	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 自动喷洒水增压泵 G=1L/S H=44m N=2.2KW	台	2.000	1600.000	3,200	3,200.00	100%	2.00	3,200.00		0.00	0%		
3.4.35	隔膜式气压水罐	块	2.000	400.000	800	800.00	100%	2.00	800.00		0.00	0%		
3.4.36	压力表、真空表	个	4.000	40.000	160	160.00	100%	4.00	160.00		0.00	0%		
3.4.37	避震喉 DN150	个	4.000	497.530	1,990	1,990.12	100%	4.00	1,990.12		0.00	0%		
3.4.38	避震喉 DN50	个	4.000	159.640	639	638.56	100%	4.00	638.56		0.00	0%		
3.4.39	低压法兰阀门 明杆闸阀 DN150	个	2.000	806.230	1,612	1,612.46	100%	2.00	1,612.46		0.00	0%		
3.4.40	低压法兰阀门 闸阀 DN150	个	2.000	806.230	1,612	1,612.46	100%	2.00	1,612.46		0.00	0%		
3.4.41	低压法兰阀门 闸阀 DN100	个	2.000	463.820	928	927.64	100%	2.00	927.64		0.00	0%		
3.4.42	低压法兰阀门 止回阀 DN100	个	1.000	443.820	444	443.82	100%	1.00	443.82		0.00	0%		
3.4.43	低压法兰阀门 止回阀 DN150	个	2.000	603.820	1,208	1,207.64	100%	2.00	1,207.64		0.00	0%		
3.4.44	低压螺纹阀门 明杆闸阀 DN50	个	2.000	196.070	392	392.14	100%	2.00	392.14		0.00	0%		
3.4.45	低压螺纹阀门 闸阀 DN50	个	3.000	196.070	588	588.21	100%	3.00	588.21		0.00	0%		
3.4.46	低压螺纹阀门 止回阀 DN50	个	2.000	176.070	352	352.14	100%	2.00	352.14		0.00	0%		
3.4.47	低压螺纹阀门 明杆闸阀 DN158	个	2.000	501.900	1,004	1,003.80	100%	2.00	1,003.80		0.00	0%		
3.4.48	沟槽式法兰 DN150	片	12.000	404.230	4,851	4,850.76	100%	12.00	4,850.76		0.00	0%		
3.4.49	沟槽式法兰 DN100	片	6.000	233.820	1,403	1,402.92	100%	6.00	1,402.92		0.00	0%		
3.4.50	喇叭口 DN150	个	2.000	65.000	130	130.00	100%	2.00	130.00		0.00	0%		
3.4.51	喇叭口 DN100	个	1.000	30.000	30	30.00	100%	1.00	30.00		0.00	0%		
3.4.52	喇叭口 DN150	个	2.000	65.000	130	130.00	100%	2.00	130.00		0.00	0%		

工程量清单报表

工程截止: 2015年9月30日

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合同价	目前累计完成			完成%	到上期累计完成			本期完成		
						数量	金额	数量		数量	金额	数量	金额	数量	完成%
	细目3小计				301,797		275,818.96		91%		275,818.96		0.00		0%
4	建筑采暖、通风设施														
4.1	采暖工程														
4.1.1	无缝钢管 焊接连接 DN100	m	43.000	86.300	3,711	41.90	3,615.97	41.90	97%		3,615.97		0.00		0%
4.1.2	热镀锌钢管 丝接 DN80	m	52.000	65.030	3,382	52.00	3,381.56	52.00	100%		3,381.56		0.00		0%
4.1.3	热镀锌钢管 丝接 DN70	m	38.000	64.120	2,437	23.00	1,474.76	23.00	61%		1,474.76		0.00		0%
4.1.4	热镀锌钢管 丝接 DN50	m	30.000	48.140	1,444	26.10	1,256.45	26.10	87%		1,256.45		0.00		0%
4.1.5	热镀锌钢管 丝接 DN40	m	104.000	40.860	4,249	75.00	3,064.50	75.00	72%		3,064.50		0.00		0%
4.1.6	热镀锌钢管 丝接 DN32	m	33.000	35.710	1,178	33.00	1,178.43	33.00	100%		1,178.43		0.00		0%
4.1.7	热镀锌钢管 丝接 DN25	m	124.000	33.160	4,112	110.70	3,670.81	110.70	89%		3,670.81		0.00		0%
4.1.8	热镀锌钢管 丝接 DN20	m	358.000	28.920	10,353	357.90	10,350.47	357.90	100%		10,350.47		0.00		0%
4.1.9	蝶阀 DN20	个	52.000	20.820	1,083	52.00	1,082.64	52.00	100%		1,082.64		0.00		0%
4.1.10	两通电动阀 DN20	个	26.000	75.000	1,950	26.00	1,950.00	26.00	100%		1,950.00		0.00		0%
4.1.11	电动直行程执行机构	台	26.000	1500.000	39,000	26.00	39,000.00	26.00	100%		39,000.00		0.00		0%
4.1.12	蝶阀 DN20	个	26.000	20.820	541	26.00	541.32	26.00	100%		541.32		0.00		0%
4.1.13	蝶阀 DN25	个	2.000	32.310	65	2.00	64.62	2.00	100%		64.62		0.00		0%
4.1.14	蝶阀 DN40	个	2.000	150.000	300	2.00	300.00	2.00	100%		300.00		0.00		0%
4.1.15	A型对夹式蝶阀 DN100	个	2.000	424.550	849	2.00	849.10	2.00	100%		849.10		0.00		0%
4.1.16	焊接法兰阀门 DN50	个	1.000	160.000	160	1.00	160.00	1.00	100%		160.00		0.00		0%
4.1.17	橡塑管壳(管道) 管道Φ133mm	m3	0.500	1150.000	575	0.00	0.00	0.00	0%		0.00		0.00		0%
4.1.18	橡塑管壳(管道) 管道Φ89mm	m3	0.800	1150.000	920	0.00	0.00	0.00	0%		0.00		0.00		0%
4.1.19	橡塑管壳(管道) 管道Φ57mm	m3	1.600	1150.000	1,840	0.00	0.00	0.00	0%		0.00		0.00		0%
4.1.20	室内焊接钢管(螺纹连接) DV50	m	3.000	62.037	186	0.00	0.00	0.00	0%		0.00		0.00		0%
4.1.21	室内焊接钢管(螺纹连接) DV40	m	116.000	51.920	6,023	114.30	5,934.46	114.30	99%		5,934.46		0.00		0%
4.1.22	室内焊接钢管(螺纹连接) DV25	m	63.000	40.960	2,580	62.90	2,576.38	62.90	100%		2,576.38		0.00		0%
4.1.23	室内焊接钢管(螺纹连接) DV20	m	1.000	33.480	33	0.00	0.00	0.00	0%		0.00		0.00		0%
4.1.24	室内承插塑料给水管(粘接) 32mm	m	128.000	20.300	2,598	0.00	0.00	0.00	0%		0.00		0.00		0%
4.1.25	铸铁散热器	片	390.000	59.840	23,338	390.00	23,337.60	390.00	100%		23,337.60		0.00		0%
4.1.26	蝶阀 DN25 闸阀	个	8.000	46.310	370	8.00	370.48	8.00	100%		370.48		0.00		0%
4.1.27	蝶阀 DN20	个	1.000	34.820	35	1.00	34.82	1.00	100%		34.82		0.00		0%
4.1.28	蝶阀 DN27 三通调节阀	个	23.000	57.820	1,330	23.00	1,329.86	23.00	100%		1,329.86		0.00		0%
4.1.29	自动排气阀 DN20	个	1.000	20.000	20	1.00	20.00	1.00	100%		20.00		0.00		0%
4.1.30	室内钢管焊接 DN100	m	35.000	46.300	1,621	33.20	1,537.16	33.20	95%		1,537.16		0.00		0%
